# *16294 B/S Isafjord_bygherre_tidsplan

Udskrevet den 25. marts 2024 09:46

POWERED BY LETSBUILD

Navn

mar 2024 | apr 2024 | maj 2024 | jun 2024 | jul 2024 | aug 2024 | sep 2024 | okt 2024

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
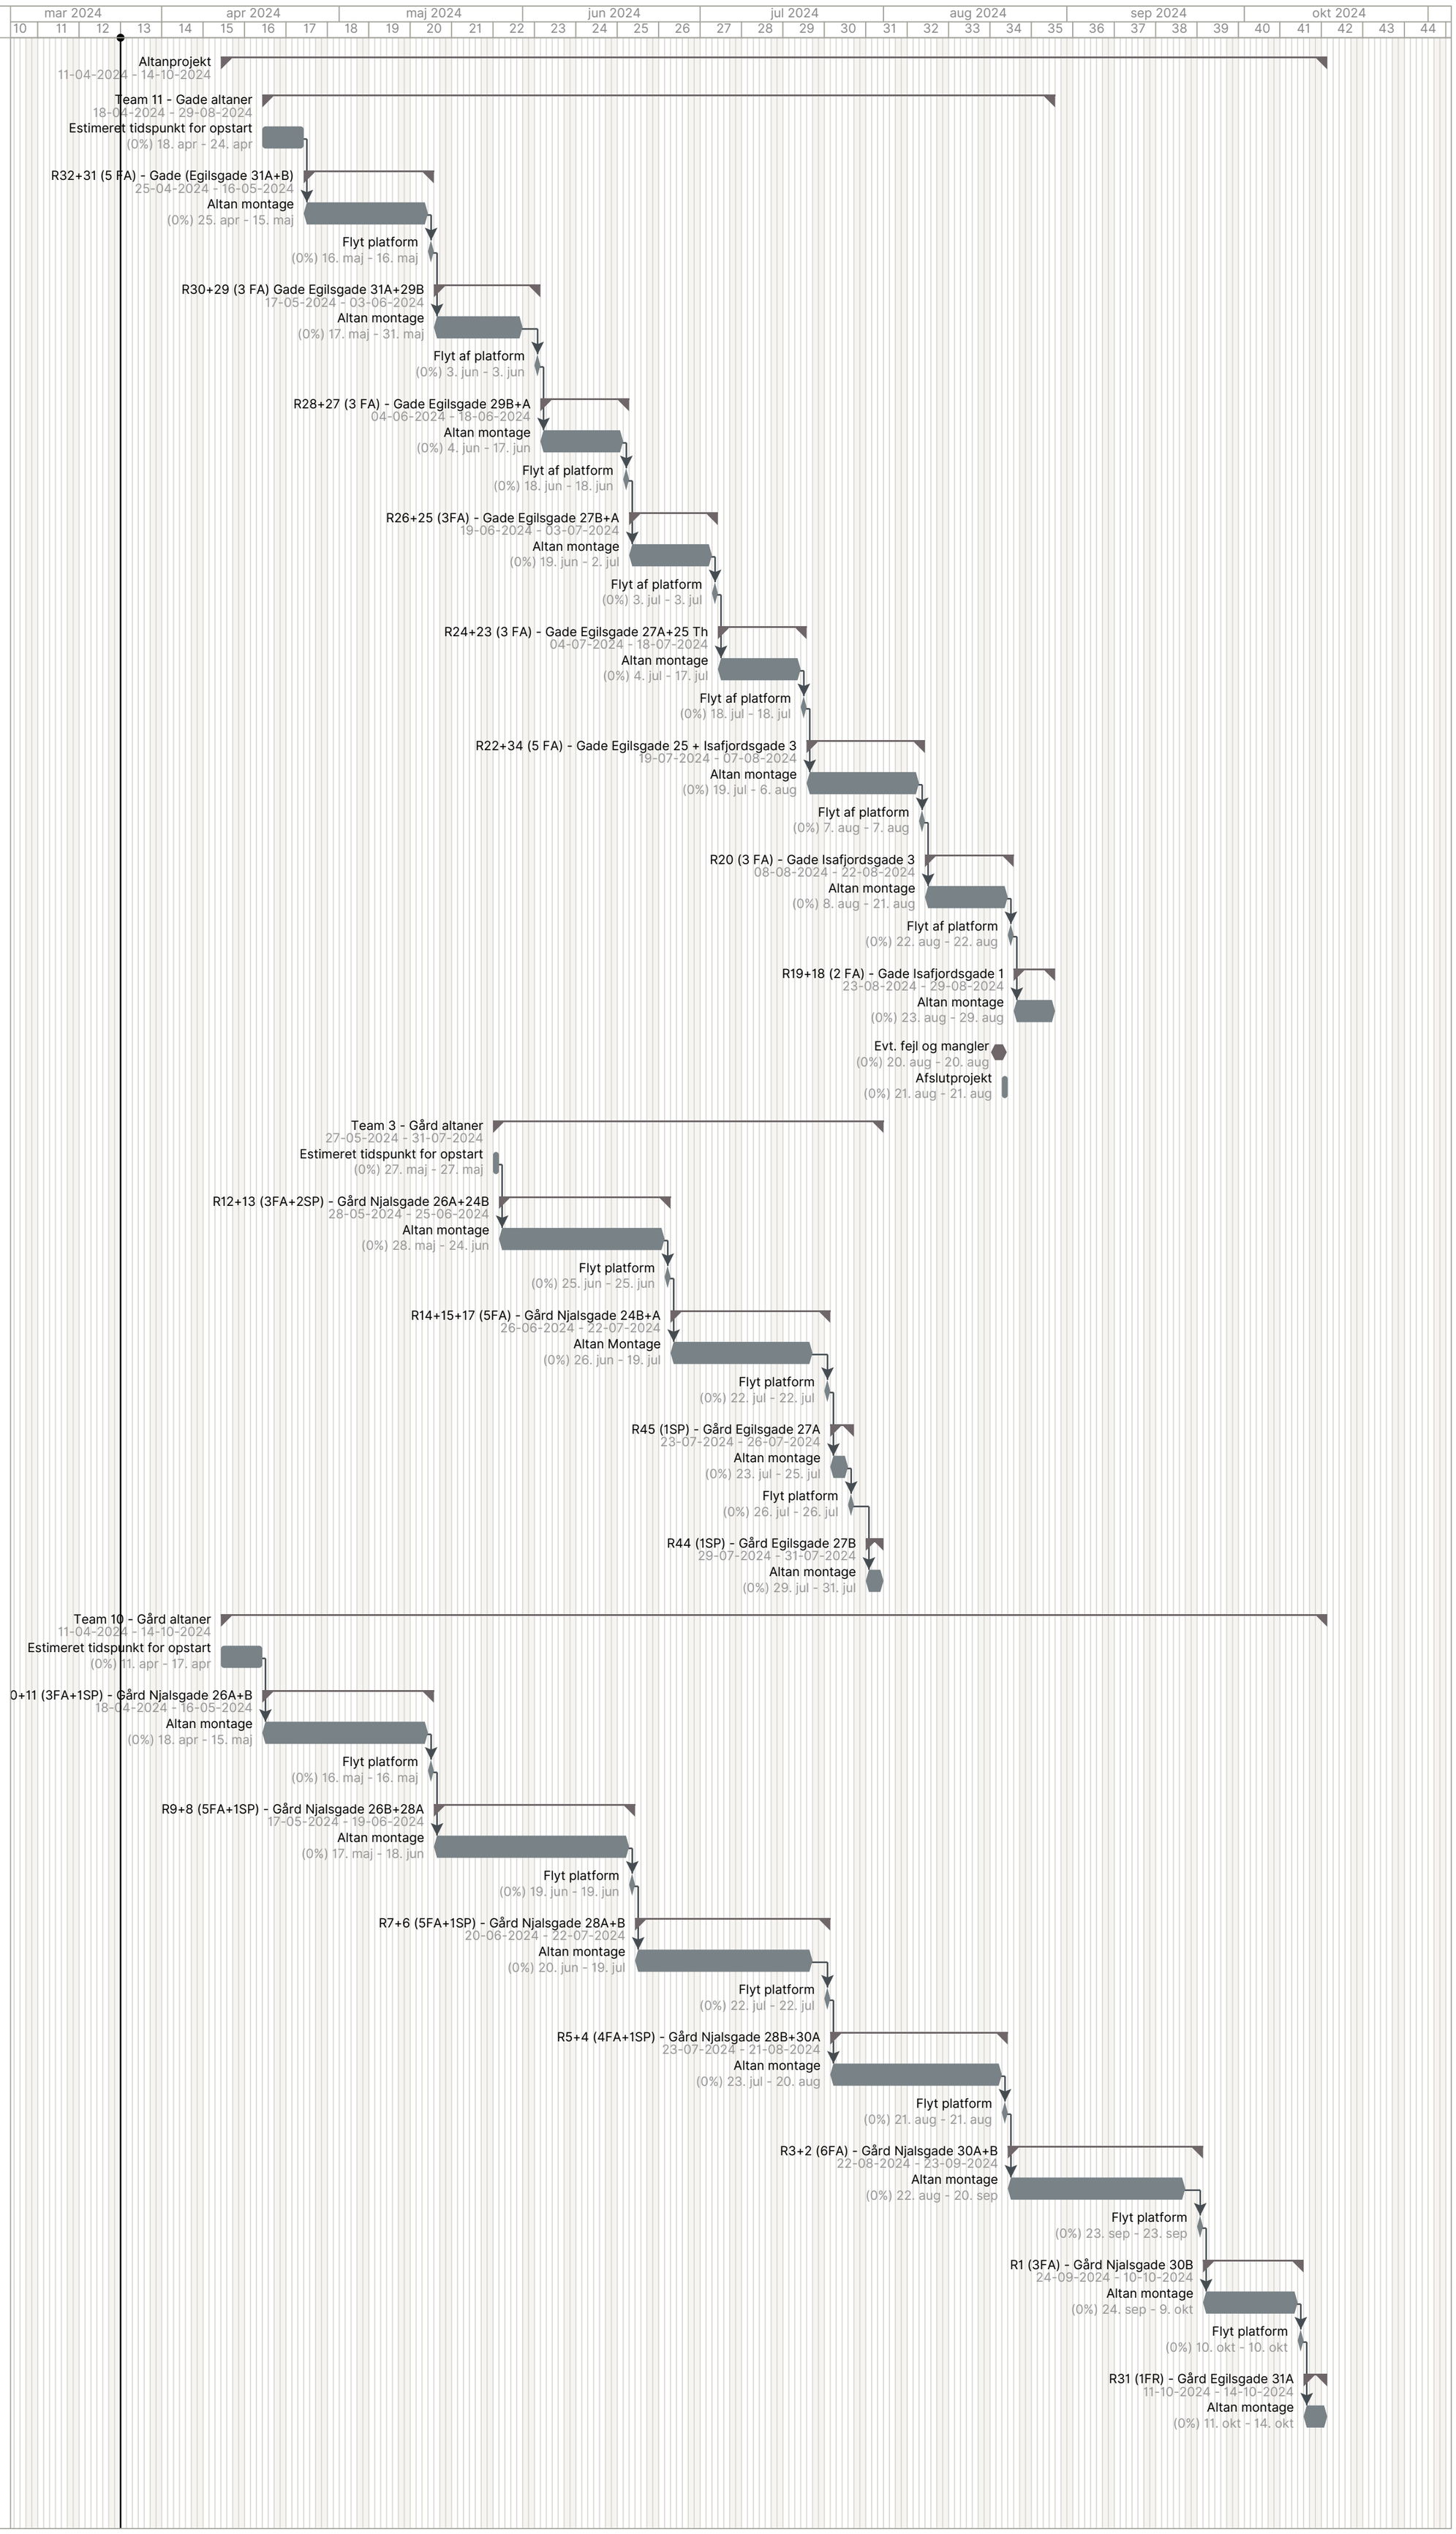
- Altanprojekt
  11-04-2024 - 14-10-2024 (186 days)
- Team 11 - Gade altaner
  18-04-2024 - 29-08-2024 (133 days)
  - Estimeret tidspunkt for opstart
    18. apr - 24. apr (5 days) (0%)
- R32+31 (5 FA) - Gade (Egilsgade 31A+B)
  25-04-2024 - 16-05-2024 (21 days)
  - Altan montage
    25. apr - 15. maj (14 days) (0%)
  - Flyt platform
    16. maj - 16. maj (1 days) (0%)
- R30+29 (3 FA) Gade Egilsgade 31A+29B
  17-05-2024 - 03-06-2024 (17 days)
  - Altan montage
    17. maj - 31. maj (10 days) (0%)
  - Flyt af platform
    3. jun - 3. jun (1 days) (0%)
- R28+27 (3 FA) - Gade Egilsgade 29B+A
  04-06-2024 - 18-06-2024 (14 days)
  - Altan montage
    4. jun - 17. jun (10 days) (0%)
  - Flyt af platform
    18. jun - 18. jun (1 days) (0%)
- R26+25 (3FA) - Gade Egilsgade 27B+A
  19-06-2024 - 03-07-2024 (14 days)
  - Altan montage
    19. jun - 2. jul (10 days) (0%)
  - Flyt af platform
    3. jul - 3. jul (1 days) (0%)
- R24+23 (3 FA) - Gade Egilsgade 27A+25 Th
  04-07-2024 - 18-07-2024 (14 days)
  - Altan montage
    4. jul - 17. jul (10 days) (0%)
  - Flyt af platform
    18. jul - 18. jul (1 days) (0%)
- R22+34 (5 FA) - Gade Egilsgade 25 + Isafjordsgade 3
  19-07-2024 - 07-08-2024 (19 days)
  - Altan montage
    19. jul - 6. aug (13 days) (0%)
  - Flyt af platform
    7. aug - 7. aug (1 days) (0%)
- R20 (3 FA) - Gade Isafjordsgade 3
  08-08-2024 - 22-08-2024 (14 days)
  - Altan montage
    8. aug - 21. aug (10 days) (0%)
  - Flyt af platform
    22. aug - 22. aug (1 days) (0%)
- R19+18 (2 FA) - Gade Isafjordsgade 1
  23-08-2024 - 29-08-2024 (6 days)
  - Altan montage
    23. aug - 29. aug (5 days) (0%)
- Evt. fejl og mangler
  20. aug - 20. aug (1 days) (0%)
- Afslutprojekt
  21. aug - 21. aug (1 days) (0%)
- Team 3 - Gård altaner
  27-05-2024 - 31-07-2024 (65 days)
  - Estimeret tidspunkt for opstart
    27. maj - 27. maj (1 days) (0%)
- R12+13 (3FA+2SP) - Gård Njalsgade 26A+24B
  28-05-2024 - 25-06-2024 (28 days)
  - Altan montage
    28. maj - 24. jun (20 days) (0%)
  - Flyt platform
    25. jun - 25. jun (1 days) (0%)
- R14+15+17 (5FA) - Gård Njalsgade 24B+A
  26-06-2024 - 22-07-2024 (26 days)
  - Altan Montage
    26. jun - 19. jul (18 days) (0%)
  - Flyt platform
    22. jul - 22. jul (1 days) (0%)
- R45 (1SP) - Gård Egilsgade 27A
  23-07-2024 - 26-07-2024 (3 days)
  - Altan montage
    23. jul - 25. jul (3 days) (0%)
  - Flyt platform
    26. jul - 26. jul (1 days) (0%)
- R44 (1SP) - Gård Egilsgade 27B
  29-07-2024 - 31-07-2024 (2 days)
  - Altan montage
    29. jul - 31. jul (3 days) (0%)
- Team 10 - Gård altaner
  11-04-2024 - 14-10-2024 (186 days)
  - Estimeret tidspunkt for opstart
    11. apr - 17. apr (5 days) (0%)
- R10+11 (3FA+1SP) - Gård Njalsgade 26A+B
  18-04-2024 - 16-05-2024 (28 days)
  - Altan montage
    18. apr - 15. maj (19 days) (0%)
  - Flyt platform
    16. maj - 16. maj (1 days) (0%)
- R9+8 (5FA+1SP) - Gård Njalsgade 26B+28A
  17-05-2024 - 19-06-2024 (33 days)
  - Altan montage
    17. maj - 18. jun (22 days) (0%)
  - Flyt platform
    19. jun - 19. jun (1 days) (0%)
- R7+6 (5FA+1SP) - Gård Njalsgade 28A+B
  20-06-2024 - 22-07-2024 (32 days)
  - Altan montage
    20. jun - 19. jul (22 days) (0%)
  - Flyt platform
    22. jul - 22. jul (1 days) (0%)
- R5+4 (4FA+1SP) - Gård Njalsgade 28B+30A
  23-07-2024 - 21-08-2024 (29 days)
  - Altan montage
    23. jul - 20. aug (21 days) (0%)
  - Flyt platform
    21. aug - 21. aug (1 days) (0%)
- R3+2 (6FA) - Gård Njalsgade 30A+B
  22-08-2024 - 23-09-2024 (32 days)
  - Altan montage
    22. aug - 20. sep (22 days) (0%)
  - Flyt platform
    23. sep - 23. sep (1 days) (0%)
- R1 (3FA) - Gård Njalsgade 30B
  24-09-2024 - 10-10-2024 (16 days)
  - Altan montage
    24. sep - 9. okt (12 days) (0%)
  - Flyt platform
    10. okt - 10. okt (1 days) (0%)
- R31 (1FR) - Gård Egilsgade 31A
  11-10-2024 - 14-10-2024 (3 days)
  - Altan montage
    11. okt - 14. okt (2 days) (0%)
